

<div><div><div><div><div></div><div>MINGUERO INDUSTRIA Y TURISMO</div></div><div><div>FONTUR</div><div>COLOMBIA</div></div><div><div>TODOS POR UN NUEVO PAIS</div><div>NO PASA UN DIA SIN</div></div></div></div></div>		INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORIA QUINCENAL No		9	<div><div><div>JOYCO</div><div>calidad en infraestructura</div></div></div>		<div><div><div>M&SV</div><div>Mantenimiento y Seguridad Vial</div></div></div>									
PROYECTO No.		FNT 219 DE 2015		OBJETO DEL PROYECTO		*REALIZAR LAS OBRAS DE SENALIZACION VEHICULAR Y PEATONAL TURISTICA DE LA CIUDAD DE MEDELLIN, MEDIANTE LA PRODUCCION, SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES TIPO VERTICALES ELEVADAS TURISTICAS, TIPO TÓTEM, PANELES DIRECCIONALES Y MONOLITOS ENTRE OTRAS.										
MUNICIPIO		MEDELLIN		DEPARTAMENTO		ANTIOQUIA		PERIODO DEL INFORME		22/03/2016	AL	8/04/2016	FECHA INFORME		11/04/2016	
OBJETO DEL CONTRATO		REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA,ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA A LAS OBRAS DE SENALIZACION VEHICULAR Y PEATONAL TURISTICA DE LA CIUDAD DE MEDELLIN, MEDIANTE LA PRODUCCION, SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES TIPO VERTICALES ELEVADAS TURISTICAS, TIPO TÓTEM, PANELES DIRECCIONALES Y MONOLITOS ENTRE OTRAS.														
CONTRATO DE OBRA																
CONTRATO No.:		FNT-219-2015														
CONTRATISTA:		MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD VIAL SAS														
FECHA DE INICIACION:		23 de noviembre de 2015														
PLAZO INICIAL (MESES)		6.00														
FECHA DE TERMINACION INICIAL		22 de mayo de 2016														
ESTADO DEL CONTRATO		EN EJECUCION														
TIEMPO SUSPENDIDO (DIAS)		0														
PLAZO ADICIONAL (MESES)		0.00														
FECHA DE TERMINACION FINAL		22 de mayo de 2016														
PLAZO EJECUTADO %		77,35%														
VALOR INICIAL :		\$1.586.609.205														
VALOR ADICIONES:		\$0														
VALOR ACTUALIZADO:		\$1.586.609.205														
SALDO POR AMORTIZAR ANTICIPO		\$475.982.762														
VALOR PAGADO:		\$0														
EJECUCION PRESUPUESTAL		0,00%														
ESTADO DE LAS LICENCIAS O PERMISOS DEL PROYECTO																
LICENCIA O PERMISO		ENTIDAD QUE LO OTORGA		FECHA DE RADICACION		ESTADO		FECHA DE EXPEDICION								
PERMISO INTERVENCION PATRIMONIO CULTURAL DE MEDELLIN		SECRETARIA DE MOVILIDAD Y ALCALDIA DE MEDELLIN				EN TRAMITE		PENDIENTE								
OBSERVACIONES																
Se realizo comité de seguimiento al contrato en las instalaciones de FONTUR.																
Aunque la grafica muestra un avance de cero, esto se debe a que no hay aun facturacion, pero el avancedel proyecto es apropiado.																
El contratista avanza en la fabricacion de estructura para señales, actualizacion de diseños viales y estudio para actualizacion de diseños de señalizacion Peatonal.																
Se presento solicitud de prorroga al contrato de obra e interventoria, así como la ampliacion del alcance del contrato de obra para realizar la actualizacion de los estudios y diseños.																
El contratista entrego avance de los diseños de señalizacion vial y tambien avance en diseño de señalizacion peatonal. Augue manifiesta que la Alcaldia de Medellin aun no les ha entregado informacion para la señalizacion peatonal; la interventoria a advertido que la responsabilidad por la actualizacion de los estudios y diseños es exclusiva del contratista.																
AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA																
		PROGRAMADO \$		EJECUTADO \$		DIFERENCIA \$		CUMPLIMIENTO % (E/P)								
Acumulado anterior		\$ -		\$ -		\$ -		0%								
Durante el periodo		\$ -		\$ -		\$ -		0%								
Acumulado actual		\$ -		\$ -		\$ -		0%								
PORCENTAJE TOTAL PROGRAMADO A LA FECHA								0,000%								
PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO A LA FECHA								0,000%								
AVANCE FISICO DEL CONTRATO DE OBRA																
ACTIVIDADES - CAPITULOS		AVANCE MES/SEMANA			nov-15	dic-15	ene-16	feb-16	mar-16	abr-16	may-16	jun-16	jul-16	ago-16		
		MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12			
		% PROG.	% EJEC.	CUMPLI %	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.2 FABRICACIÓN		0%	0%	0%												
1.2.1 FABRICACION SENALIZACION PEATONAL																
1.2.1.1 TÓTEM		2,56%	0%	0%												
1.2.1.1.1 Diseño																
1.2.1.1.2 Compra de Materiales																
1.2.1.1.3 Fabricación																
1.2.1.2 MONOLITO		6,76%	0%	0%												
1.2.1.2.1 Diseño																
1.2.1.2.2 Compra de Materiales																
1.2.1.2.3 Fabricación																
1.2.1.3 AVISO DIRECCIONAL		17,94%	0%	0%												
1.2.1.3.1 Diseño																
1.2.1.3.2 Compra de Materiales																
1.2.1.3.3 Fabricación																
1.2.1.4 PANEL INTERPRETATIVO ADOASADO		1,38%	0%	0%												
1.2.1.4.1 Diseño																
1.2.1.4.2 Compra de Materiales																
1.2.1.4.3 Fabricación																
1.2.1.5 PANEL INTERPRETATIVO DE PIE		1,35%	0%	0%												
1.2.1.5.1 Diseño																
1.2.1.5.2 Compra de Materiales																
1.2.1.5.3 Fabricación																
1.2.1.6 PANEL INTERPRETATIVO DE MESA		0,20%	0%	0%												
1.2.1.6.1 Diseño																
1.2.1.6.2 Compra de Materiales																
1.2.1.6.3 Fabricación																
1.2.1.7 DISPOSITIVO DE UBICACIÓN		9,61%	0%	0%												
1.2.1.7.1 Diseño																
1.2.1.7.2 Compra de Materiales																
1.2.1.7.3 Fabricación																
1.2.2 FABRICACION SENALIZACION TURISTICA VEHICULAR																
1.2.2.1 BANDERA BIENVENIDA DE 7 mt		9,86%	0%	0%												
1.2.2.1.1 Diseño																
1.2.2.1.2 Compra de Materiales																

EJECUTADO ACUMULADO

PROGRAMADO ACUMULADO

42331

42360

42391

42420

42451

42481

42512

0

100000000

200000000

300000000

400000000

500000000


600000000

700000000

800000000

900000000

1E+09

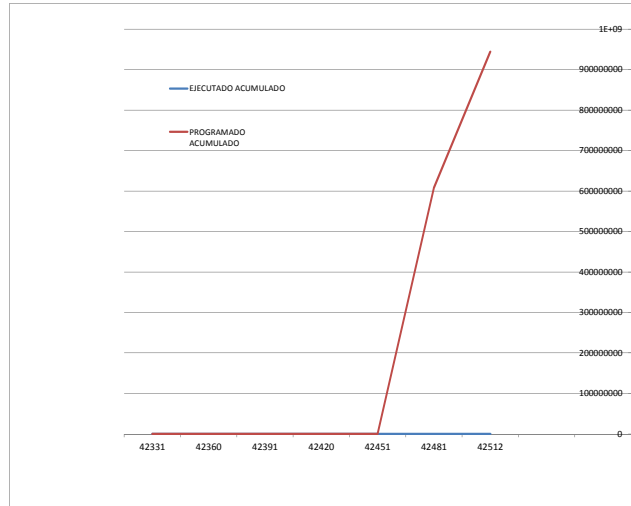



CONVENCIONES

- CAPÍTULOS
- SUBCAPÍTULO
- TAREA
- ACTIVIDADES

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

		PROGRAMADO		
MES	FECHA	MES	SEMANAL	ACUMULADO
INICIO	23/11/2015	\$ -		
1	22/12/2015	\$ -		
2	22/01/2016	\$ -		
3	20/02/2016	\$ -		
4	22/03/2016	\$ -		
5	21/04/2016	\$ 608.000.800,00		\$ 608.000.800,00
6	22/05/2016	\$ 336.476.800,00		\$ 944.477.600,00

		PROGRAMADO		
MES	FECHA	MES	ACUMULADO	
INICIO	23/11/2015	\$ -	\$ -	
1	22/12/2015	\$ -	\$ -	
2	22/01/2016	\$ -	\$ -	
3	20/02/2016	\$ -	\$ -	
4	22/03/2016	\$ -	\$ -	
5	21/04/2016	\$ 608.000.800,00	\$ 608.000.800,00	
6	22/05/2016	\$ 336.476.800,00	\$ 944.477.600,00	

