

PROYECTO No.	FNT 219 DE 2015	OBJETO DEL PROYECTO		"REALIZAR LAS OBRAS DE SEÑALIZACION VEHICULAR Y PEATONAL TURISTICA DE LA CIUDAD DE MEDELLIN, MEDIANTE LA PRODUCCION, SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES TIPO VERTICALES ELEVADAS TURISTICAS, TIPO TÓTEM, PANELES DIRECCIONALES Y MONOLITOS ENTRE OTRAS.					
MUNICIPIO	MEDELLIN	DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA	PERIODO DEL INFORME	24/04/2016	AL	8/05/2016	FECHA INFORME	9/05/2016
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA A LAS OBRAS DE SEÑALIZACIÓN VEHICULAR Y PEATONAL TURISTICA DE LA CIUDAD DE MEDELLIN, MEDIANTE LA PRODUCCION, SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES TIPO VERTICALES ELEVADAS TURISTICAS, TIPO TÓTEM, PANELES DIRECCIONALES Y MONOLITOS ENTRE OTRAS.								


CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	FNT-219-2015
CONTRATISTA:	MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD VIAL SAS
FECHA DE INICIACIÓN:	23 de noviembre de 2015
PLAZO INICIAL (MESES)	6.00
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	22 de mayo de 2016
ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
TIEMPO SUSPENDIDO (DIAS)	0
PLAZO ADICIONAL (MESES)	0.00
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	22 de mayo de 2016
PLAZO EJECUTADO %	92.82%
VALOR INICIAL:	\$1.586.609.205
VALOR ADICIONES:	\$0
VALOR ACTUALIZADO:	\$1.586.609.205
SALDO POR AMORTIZAR ANTICIPO	\$475.982.762
VALOR PAGADO:	\$0
EJECUCION PRESUPUESTAL	0.00%

CONTRATO DE INTERVENTORIA	
CONTRATO No.:	FNT 054-2015
CONTRATISTA:	JOTICO SAS
FECHA DE INICIACIÓN:	23 de noviembre de 2015
PLAZO INICIAL (MESES)	6,00
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	22 de mayo de 2016
<b>ESTADO DEL CONTRATO</b>	<b>EN EJECUCION</b>
TIEMPO SUSPENDIDO (DIAS)	0
PLAZO ADICIONAL (MESES)	0,00
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	22 de mayo de 2016
PLAZO EJECUTADO %	92,82%
VALOR INICIAL:	\$95.646.008
VALOR ADICIONES:	\$0
VALOR ACTUALIZADO:	\$95.646.008
SALDO POR AMORTIZAR ANTIPO	
VALOR PAGADO:	\$0
EJECUCION PRESUPUESTAL	6,00%

ESTADO DE LAS LICENCIAS O PERMISOS DEL PROYECTO				
LICENCIA O PERMISO	ENTIDAD QUE LO OTORGA	FECHA DE RADICACION	ESTADO	FECHA DE EXPEDICION
No se requiere	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

OBSERVACIONES
Se realizo comité de seguimiento al contrato en las instalaciones de FONTUR.
Aunque la grafica muestra un avance de cero, esto se debe a que no hay aun facturación, pero el avance del proyecto es apropiado en la señalización vehicular, en la señalización peatonal el avance aun es bajo, sobre todo por el tema de diseños.
El contratista avanza en la fabricacion de estructura para señales, actualizacion de diseños viales y estudio para actualizacion de diseños de señalizacion Peonatoal.
El contratista entrego avance de los diseños de señalizacion vial y tambien avance en diseño de señalizacion peatonal.
Se dio inicio a las actividades de excavaciones para la cimentacion de la señalización vehicular, actividades que consideramos que avanzan en buen ritmo; se espera que al finalizar la presente semana se este terminando y se inicie con la fundicion de la cimentacion.

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA				
	PROGRAMADO \$	EJECUTADO \$	DIFERENCIA \$	CUMPLIMIENTO % (E/P)
Acumulado anterior	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Durante el periodo	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Acumulado actual	\$ -	\$ -	\$ -	0%
<b>PORCENTAJE TOTAL PROGRAMADO A LA FECHA</b>				<b>0.000%</b>
<b>PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO A LA FECHA</b>				<b>0.000%</b>

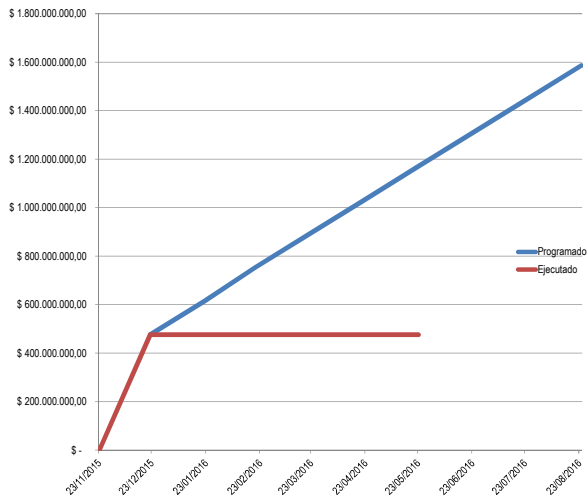

			AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO DE OBRA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
AVANCE MES/SEMANA			nov-15				dic-15				ene-16				feb-16				mar-16				abr-16				may-16				jun-16				jul-16				ago-16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				MES 5				MES 6				MES 7				MES 8				MES 9				MES 10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			S 2				S 2-5				S 6-9				S 10-14				S 15-18				S 19-22				S 23-26				S 27-30				S 31-34				S 34-37																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
ACTIVIDADES - CAPÍTULOS	% PROG.	% EJEC.	CUMPLI %	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1

OBSERVACIONES	
---------------	--

Se dio inicio a las actividades de escavaciones para la cimentación de la señalización vehicular, actividades que consideramos que avanzan en buen ritmo; se espera que al finalizar la presente semana se este terminando y se inicie con la fundición de la cimentación.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA









[REDACTED]

[REDACTED]

		PROGRAMADO	
MES	FECHA	MES	SEMANAL
INICIO	23/11/2015		
1	22/12/2015	\$ 475.982.761,50	
2	22/01/2016	\$ 138.828.305,44	
3	20/02/2016	\$ 138.828.305,44	
4	22/03/2016	\$ 138.828.305,44	
5	22/04/2016	\$ 138.828.305,44	
6	23/05/2016	\$ 138.828.305,44	
	23/06/2016	\$ 138.828.305,44	
	24/07/2016	\$ 138.828.305,44	
	24/08/2016	\$ 138.828.305,44	

VR TOTAL CONTRATO \$ 1.586.609.205,00

#### VALOR PARCIAL

#### IVA

#### SEÑALIZACION PEATONAL

AVISO DIRECCIONAL	\$ 169.400.000,00	\$ 27.104.000,00
PANEL INTERPRET. ADOSADO	\$ 13.068.000,00	\$ 2.090.880,00

#### SEÑALIZACION ELEVADA

BANDERA BIENV 7 MTS	\$ 84.700.000,00	\$ 13.552.000,00
BANDERA TIPO INVIAS	\$ 21.780.000,00	\$ 3.484.800,00
LAMA PARA BANDERA	\$ 9.292.800,00	\$ 1.486.848,00
TABLERO PASAVIAS	\$ 23.232.000,00	\$ 3.717.120,00
TABLERO BANDERA	\$ 4.356.000,00	\$ 696.960,00
PASAVIAS 12 MTS	\$ 18.150.000,00	\$ 2.904.000,00
PASAVIAS 24 MTS	\$ 21.780.000,00	\$ 3.484.800,00

#### SUMINISTRO

TOTEM CON CIMENTACION MOD	\$ 23.038.688,00	\$ 3.686.190,08
MONOLITO CIMENTACION MOD	\$ 60.885.584,00	\$ 9.741.693,44
PANEL INTERPRET PIE	\$ 12.127.248,00	\$ 1.940.359,68
PANEL INTERPRET MESA	\$ 1.853.872,00	\$ 296.619,52
BANDERA 4 X 1,5	\$ 273.890.955,00	\$ 43.822.552,80
SEÑAL DIRECCIONAL 4 MODUL	\$ 186.742.861,00	\$ 29.878.857,76
BANDERAS DOBLES 7 MTS	\$ 12.684.764,00	\$ 2.029.562,24
BANDERAS DOBLES 4 MTS	\$ 9.770.798,00	\$ 1.563.327,68

#### VALOR PARCIAL

#### A.I.U.

#### INSTALACION SEÑALES

TRANSP. INSTAL SEÑAL PEAT	\$ 27.007.200,00	\$ 45.531.831,49
TRANSP. INSTAL SEÑAL VEHIC	\$ 58.685.000,00	\$ 45.531.831,49

#### VALOR PARCIAL

#### A.I.U.

#### INSTALACION SEÑALES

TRANSPORTE MATERIALES	\$ 45.000.000,00	\$ 45.531.831,49
LOCALIZACION REPLANTEO	\$ 84.043.740,00	\$ 45.531.831,49
APIQUES HASTA 4 MTS	\$ 374.343,00	\$ 45.531.831,49
AJUSTES	\$ 73.792,00	\$ 45.531.831,49



#####  
#####  
13.134.182  
65.670.911  
10.507.346  
#####

	EJECUTADO		
ACUMULADO	MES	SEMANAL	ACUMULADO
	\$ -		\$ -
\$ 475.982.761,50	\$ 475.982.761,50	\$ -	\$ 475.982.761,50
\$ 614.811.066,94	\$ -		\$ 475.982.761,50
\$ 753.639.372,38	\$ -		\$ 475.982.761,50
\$ 892.467.677,81	\$ -		\$ 475.982.761,50
\$ 1.031.295.983,25	\$ -		\$ 475.982.761,50
\$ 1.170.124.288,69	\$ -	\$ -	\$ 475.982.761,50
\$ 1.308.952.594,13	\$ -	\$ -	
\$ 1.447.780.899,56	\$ -	\$ -	
\$ 1.586.609.205,00	\$ -	\$ -	

# TOTAL

## DISEÑO, FABRICACION, TRANSPORTE E INSTALACION

\$	196.504.000,00	12%	3,10%
\$	15.158.880,00	1%	0,24%

\$	98.252.000,00	6%	1,55%
\$	25.264.800,00	2%	0,40%
\$	10.779.648,00	1%	0,17%
\$	26.949.120,00	2%	0,42%
\$	5.052.960,00	0,32%	0,08%
\$	21.054.000,00	1%	0,33%
\$	25.264.800,00	2%	0,40%

\$	26.724.878,08	2%	0,42%
\$	70.627.277,44	4%	1,11%
\$	14.067.607,68	1%	0,22%
\$	2.150.491,52	0,14%	0,03%
\$	317.713.507,80	20%	5,01%
\$	216.621.718,76	14%	3,41%
\$	14.714.326,24	1%	0,23%
\$	11.334.125,68	1%	0,18%

\$	72.539.031,49	5%	2,29%
\$	104.216.831,49	7%	3,28%

\$	90.531.831,49	6%
\$	129.575.571,49	8%
\$	45.906.174,49	3%
\$	45.605.623,49	3%

\$	1.586.609.205
----	---------------



