

PROYECTO No.	FNT 219 DE 2015	OBJETO DEL PROYECTO		*REALIZAR LAS OBRAS DE SENALIZACION VEHICULAR Y PEATONAL TURISTICA DE LA CIUDAD DE MEDELLIN, MEDIANTE LA PRODUCCION Y SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES TIPO VERTICALES ELEVADAS TURISTICAS, TIPO TÓTEM, PANELES DIRECCIONALES Y MONOLITOS ENTRE OTRAS.					
MUNICIPIO	MEDELLIN	DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA	PERIODO DEL INFORME	9/06/2016	AL	23/06/2016	FECHA INFORME	24/06/2016
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA,ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA A LAS OBRAS DE SENALIZACION VEHICULAR Y PEATONAL TURISTICA DE LA CIUDAD DE MEDELLIN, MEDIANTE LA PRODUCCION Y SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES TIPO VERTICALES ELEVADAS TURISTICAS, TIPO TÓTEM, PANELES DIRECCIONALES Y MONOLITOS ENTRE OTRAS.								

CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	FNT-219-2015
CONTRATISTA:	MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD VIAL SAS
FECHA DE INICIACIÓN:	23 de noviembre de 2015
PLAZO INICIAL (MESES)	6,00
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	22 de mayo de 2016
ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
TIEMPO SUSPENDIDO (DIAS)	0
PLAZO ADICIONAL (MESES)	0,00
FECHA DE TERMINACION FINAL	22 de agosto de 2016
PLAZO EJECUTADO %	78.39%
VALOR INICIAL :	\$1.586.609.205
VALOR ADICIONES:	\$0
VALOR ACTUALIZADO:	\$1.586.609.205
SALDO POR AMORTIZAR ANTECIP	\$475.982.762
VALOR PAGADO:	\$988.375.551
EJECUCION PRESUPUESTAL	62,29%

CONTRATO DE INTERVENTORIA	
CONTRATO No.:	FMT 054-2015
CONTRATISTA:	JOYCO SAS
FECHA DE INICIACIÓN:	23 de noviembre de 2015
PLAZO INICIAL (MESES):	7.00
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	21 de junio de 2016
ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
TIEMPO SUSPENDIDO (DIAS)	0
PLAZO ADICIONAL (MESES)	0.00
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	22 de septiembre de 2016
PLAZO EJECUTADO %	70.39%
VALOR INICIAL :	\$95.646.008
VALOR ADICIONES:	\$0
VALOR ACTUALIZADO:	\$95.646.008
SALDO POR AMORTIZAR ANTICIPO	\$0
VALOR PAGADO:	\$14.346.901
EJECUCION PRESUPUESTAL	15.00%

ESTADO DE LAS LICENCIAS O PERMISOS DEL PROYECTO				
LICENCIA O PERMISO	ENTIDAD QUE LO OTORGA	FECHA DE RADICACION	ESTADO	FECHA DE EXPEDICION
No se requiere	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

OBSERVACIONES									
Se realizo comité de seguimiento al contrato en las instalaciones de FONTUR, la presencia de los Representantes del contratista, como tambien del delegado de la Interventoria y el personal de FONTUR.									

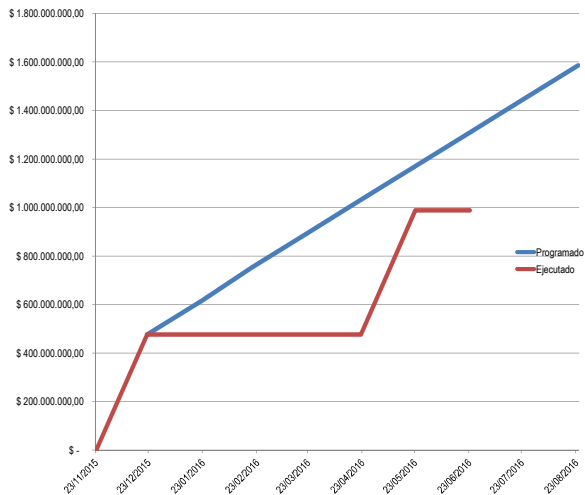
Aunque la grafica muestra un avance de cero, esto se debe a que no hay aun facturacion, pero el avance del proyecto es apropiado en la señalizacion vehicular, en la señalizacion peatonal el avance ya ha tomado fuerza debido a la que ya se tienen los contenidos de la señalizacion. Con esto los diseños ya estan avanzando.

El contratista avanza en la fabricacion de estructura para señales, el diseño de la señalización vial esta al 100% y estudio para actualización de diseños de señalización Peatonal tambien esta muy avanzado y los diseños ya estan en marcha.

El contratista entregó avance de los diseños de señalización vial y también avance en diseño de señalización peatonal.

Ya se realizaron actividades de señalización vehicular, actividades de excavaciones para la cimentación de la señalización vehicular, actividades que consideramos que avanzan en buen ritmo; se espera que al finalizar la presente mes el avance sea significativo.

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA				
	PROGRAMADO \$	EJECUTADO \$	DIFERENCIA \$	CUMPLIMIENTO % (E/P)
Acumulado anterior	\$ 1.170.124.288,69	\$ 475.982.761,50	\$(694.141.527,19)	41%
Durante el periodo	\$ 138.828.305,44	\$ 512.392.789,00	\$ 373.564.483,56	369%
Acumulado actual	\$ 1.308.952.594,13	\$ 988.375.550,50	\$(320.577.043,63)	76%
PORCENTAJE TOTAL PROGRAMADO A LA FECHA				82,500%
PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO A LA FECHA				62,295%

[illegible]

[illegible]

[REDACTED]

[REDACTED]

		PROGRAMADO	
MES	FECHA	MES	SEMANAL
INICIO	23/11/2015		
1	22/12/2015	\$ 475.982.761,50	
2	22/01/2016	\$ 138.828.305,44	
3	20/02/2016	\$ 138.828.305,44	
4	22/03/2016	\$ 138.828.305,44	
5	22/04/2016	\$ 138.828.305,44	
6	23/05/2016	\$ 138.828.305,44	
	23/06/2016	\$ 138.828.305,44	
	24/07/2016	\$ 138.828.305,44	
	24/08/2016	\$ 138.828.305,44	

VR TOTAL CONTRATO \$ 1.586.609.205,00

\$ 1.170.124.288,69

VALOR PARCIAL

IVA

SEÑALIZACION PEATONAL

AVISO DIRECCIONAL	\$ 169.400.000,00	\$ 27.104.000,00
PANEL INTERPRET. ADOSADO	\$ 13.068.000,00	\$ 2.090.880,00

SEÑALIZACION ELEVADA

BANDERA BIENV 7 MTS	\$ 84.700.000,00	\$ 13.552.000,00
BANDERA TIPO INVIAS	\$ 21.780.000,00	\$ 3.484.800,00
LAMA PARA BANDERA	\$ 9.292.800,00	\$ 1.486.848,00
TABLERO PASAVIAS	\$ 23.232.000,00	\$ 3.717.120,00
TABLERO BANDERA	\$ 4.356.000,00	\$ 696.960,00
PASAVIAS 12 MTS	\$ 18.150.000,00	\$ 2.904.000,00
PASAVIAS 24 MTS	\$ 21.780.000,00	\$ 3.484.800,00

SUMINISTRO

TOTEM CON CIMENTACION MOD	\$ 23.038.688,00	\$ 3.686.190,08
MONOLITO CIMENTACION MOD	\$ 60.885.584,00	\$ 9.741.693,44
PANEL INTERPRET PIE	\$ 12.127.248,00	\$ 1.940.359,68
PANEL INTERPRET MESA	\$ 1.853.872,00	\$ 296.619,52
BANDERA 4 X 1,5	\$ 273.890.955,00	\$ 43.822.552,80
SEÑAL DIRECCIONAL 4 MODUL	\$ 186.742.861,00	\$ 29.878.857,76
BANDERAS DOBLES 7 MTS	\$ 12.684.764,00	\$ 2.029.562,24
BANDERAS DOBLES 4 MTS	\$ 9.770.798,00	\$ 1.563.327,68

VALOR PARCIAL

A.I.U.

INSTALACION SEÑALES

TRANSP. INSTAL SEÑAL PEAT	\$ 27.007.200,00	\$ 45.531.831,49
TRANSP. INSTAL SEÑAL VEHIC	\$ 58.685.000,00	\$ 45.531.831,49

VALOR PARCIAL

A.I.U.

INSTALACION SEÑALES

TRANSPORTE MATERIALES	\$ 45.000.000,00	\$ 45.531.831,49
LOCALIZACION REPLANTEO	\$ 84.043.740,00	\$ 45.531.831,49
APIQUES HASTA 4 MTS	\$ 374.343,00	\$ 45.531.831,49
AJUSTES	\$ 73.792,00	\$ 45.531.831,49

13.134.182
65.670.911
10.507.346
#####

	EJECUTADO		
ACUMULADO	MES	SEMANAL	ACUMULADO
	\$ -		\$ -
\$ 475.982.761,50	\$ 475.982.761,50	\$ -	\$ 475.982.761,50
\$ 614.811.066,94	\$ -		\$ 475.982.761,50
\$ 753.639.372,38	\$ -		\$ 475.982.761,50
\$ 892.467.677,81	\$ -		\$ 475.982.761,50
\$ 1.031.295.983,25	\$ -		\$ 475.982.761,50
\$ 1.170.124.288,69	\$ 512.392.789,00	\$ -	\$ 988.375.550,50
\$ 1.308.952.594,13	\$ -	\$ -	\$ 988.375.550,50
\$ 1.447.780.899,56	\$ -	\$ -	
\$ 1.586.609.205,00	\$ -	\$ -	

TOTAL		DISEÑO, FABRICACION, TRANSPORTE E INSTALACION
\$ 196.504.000,00	12%	3,10%
\$ 15.158.880,00	1%	0,24%

\$ 98.252.000,00	6%	1,55%
\$ 25.264.800,00	2%	0,40%
\$ 10.779.648,00	1%	0,17%
\$ 26.949.120,00	2%	0,42%
\$ 5.052.960,00	0,32%	0,08%
\$ 21.054.000,00	1%	0,33%
\$ 25.264.800,00	2%	0,40%

\$ 26.724.878,08	2%	0,42%
\$ 70.627.277,44	4%	1,11%
\$ 14.067.607,68	1%	0,22%
\$ 2.150.491,52	0,14%	0,03%
\$ 317.713.507,80	20%	5,01%
\$ 216.621.718,76	14%	3,41%
\$ 14.714.326,24	1%	0,23%
\$ 11.334.125,68	1%	0,18%

\$ 72.539.031,49	5%	2,29%
\$ 104.216.831,49	7%	3,28%

\$ 90.531.831,49	6%
\$ 129.575.571,49	8%
\$ 45.906.174,49	3%
\$ 45.605.623,49	3%
\$ 1.586.609.205	

512392789

