

					AVANCE FISICO DEL CONTRATO DE OBRA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
AVANCE MES/SEMANA					nov-15				dic-15				ene-16				feb-16				mar-16				abr-16				may-16				jun-16				jul-16				ago-16				sep-16				oct-16				nov-16				dic-16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
ACTIVIDADES - CAPITULOS					MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				MES 5				MES 6				MES 7				MES 8				MES 9				MES 10				MES 11				MES 12				MES 13				MES 14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3</

En el presente periodo el Contratista presento la factura por pago del acta de obra No. 1, debidamente corregida, el pago de la misma ya quedo ejecutado.

Durante el presente periodo, se realizaron algunos ajustes de la señalizacion Vial, esto de acuerdo con los compromisos pactados en el comite realizado en la ciudad de Medellin.

El contrato en este momento esta suspendido de acuerdo con lo acordado en el comite celebrado en la ciudad de Medellin, debido a que la Oficina de Turismo se encuentra actualizando los contenidos de la señalizacion peatonal.

Se espera para la presente semana la aprobacion por parte de la Supervision de la cuenta de Interventoria para poder radicar el pago de la misma.



NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA	
JOSE JOAQUIN ORTIZ GARCIA	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA



[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text line]

[Redacted text line]

[Redacted text block]

[REDACTED]

1

[REDACTED]

[REDACTED]

		PROGRAMADO	
MES	FECHA	MES	SEMANAL
INICIO	23/11/2015		
1	22/12/2015	\$ 475.982.761,50	
2	22/01/2016	\$ 138.828.305,44	
3	20/02/2016	\$ 138.828.305,44	
4	22/03/2016	\$ 138.828.305,44	
5	22/04/2016	\$ 138.828.305,44	
6	23/05/2016	\$ 138.828.305,44	
	23/06/2016	\$ 138.828.305,44	
	24/07/2016	\$ -	
	24/08/2016	\$ -	
	24/09/2016	\$ 138.828.305,44	
	08/10/2016	\$ 131.524.424,44	

VR TOTAL CONTRATO \$ 1.586.609.205,00

\$ 1.170.124.288,69

VALOR PARCIAL

IVA

SEÑALIZACION PEATONAL

AVISO DIRECCIONAL	\$ 169.400.000,00	\$ 27.104.000,00
PANEL INTERPRET. ADOSADO	\$ 13.068.000,00	\$ 2.090.880,00

SEÑALIZACION ELEVADA

BANDERA BIENV 7 MTS	\$ 84.700.000,00	\$ 13.552.000,00
BANDERA TIPO INVIAS	\$ 21.780.000,00	\$ 3.484.800,00
LAMA PARA BANDERA	\$ 9.292.800,00	\$ 1.486.848,00
TABLERO PASAVIAS	\$ 23.232.000,00	\$ 3.717.120,00
TABLERO BANDERA	\$ 4.356.000,00	\$ 696.960,00
PASAVIAS 12 MTS	\$ 18.150.000,00	\$ 2.904.000,00
PASAVIAS 24 MTS	\$ 21.780.000,00	\$ 3.484.800,00

SUMINISTRO

TOTEM CON CIMENTACION MOD	\$ 23.038.688,00	\$ 3.686.190,08
MONOLITO CIMENTACION MOD	\$ 60.885.584,00	\$ 9.741.693,44
PANEL INTERPRET PIE	\$ 12.127.248,00	\$ 1.940.359,68
PANEL INTERPRET MESA	\$ 1.853.872,00	\$ 296.619,52
BANDERA 4 X 1,5	\$ 273.890.955,00	\$ 43.822.552,80
SEÑAL DIRECCIONAL 4 MODUL	\$ 186.742.861,00	\$ 29.878.857,76
BANDERAS DOBLES 7 MTS	\$ 12.684.764,00	\$ 2.029.562,24
BANDERAS DOBLES 4 MTS	\$ 9.770.798,00	\$ 1.563.327,68

VALOR PARCIAL

A.I.U.

INSTALACION SEÑALES

TRANSP. INSTAL SEÑAL PEAT	\$ 27.007.200,00	\$ 45.531.831,49
TRANSP. INSTAL SEÑAL VEHIC	\$ 58.685.000,00	\$ 45.531.831,49

VALOR PARCIAL

A.I.U.

INSTALACION SEÑALES

TRANSPORTE MATERIALES	\$ 45.000.000,00	\$ 45.531.831,49
LOCALIZACION REPLANTEO	\$ 84.043.740,00	\$ 45.531.831,49
APIQUES HASTA 4 MTS	\$ 374.343,00	\$ 45.531.831,49
AJUSTES	\$ 73.792,00	\$ 45.531.831,49

13.134.182
65.670.911
10.507.346
#####

	EJECUTADO		
ACUMULADO	MES	SEMANAL	ACUMULADO
	\$ -		\$ -
\$ 475.982.761,50	\$ 475.982.761,50	\$ -	\$ 475.982.761,50
\$ 614.811.066,94	\$ -		\$ 475.982.761,50
\$ 753.639.372,38	\$ -		\$ 475.982.761,50
\$ 892.467.677,81	\$ -		\$ 475.982.761,50
\$ 1.031.295.983,25	\$ -		\$ 475.982.761,50
\$ 1.170.124.288,69	\$ -	\$ -	\$ 475.982.761,50
\$ 1.308.952.594,13	\$ -	\$ -	\$ 475.982.761,50
\$ 1.308.952.594,13	\$ -	\$ -	\$ 475.982.761,50
\$ 1.308.952.594,13	\$ 684.870.200,00	\$ -	\$ 1.160.852.961,50
\$ 1.447.780.899,56	\$ -		\$ 1.160.852.961,50
\$ 1.579.305.324,00			

\$ 1.579.305.324,00

\$ 7.303.881,00

TOTAL

DISEÑO, FABRICACION, TRANSPORTE E INSTALACION

\$ 196.504.000,00	12%	3,10%
\$ 15.158.880,00	1%	0,24%

\$ 98.252.000,00	6%	1,55%
\$ 25.264.800,00	2%	0,40%
\$ 10.779.648,00	1%	0,17%
\$ 26.949.120,00	2%	0,42%
\$ 5.052.960,00	0,32%	0,08%
\$ 21.054.000,00	1%	0,33%
\$ 25.264.800,00	2%	0,40%


\$ 26.724.878,08	2%	0,42%
\$ 70.627.277,44	4%	1,11%
\$ 14.067.607,68	1%	0,22%
\$ 2.150.491,52	0,14%	0,03%
\$ 317.713.507,80	20%	5,01%
\$ 216.621.718,76	14%	3,41%
\$ 14.714.326,24	1%	0,23%
\$ 11.334.125,68	1%	0,18%

\$ 72.539.031,49	5%	2,29%
\$ 104.216.831,49	7%	3,28%

\$ 90.531.831,49	6%
\$ 129.575.571,49	8%
\$ 45.906.174,49	3%
\$ 45.605.623,49	3%

\$ 1.586.609.205

512392789 153717836,7 358674952

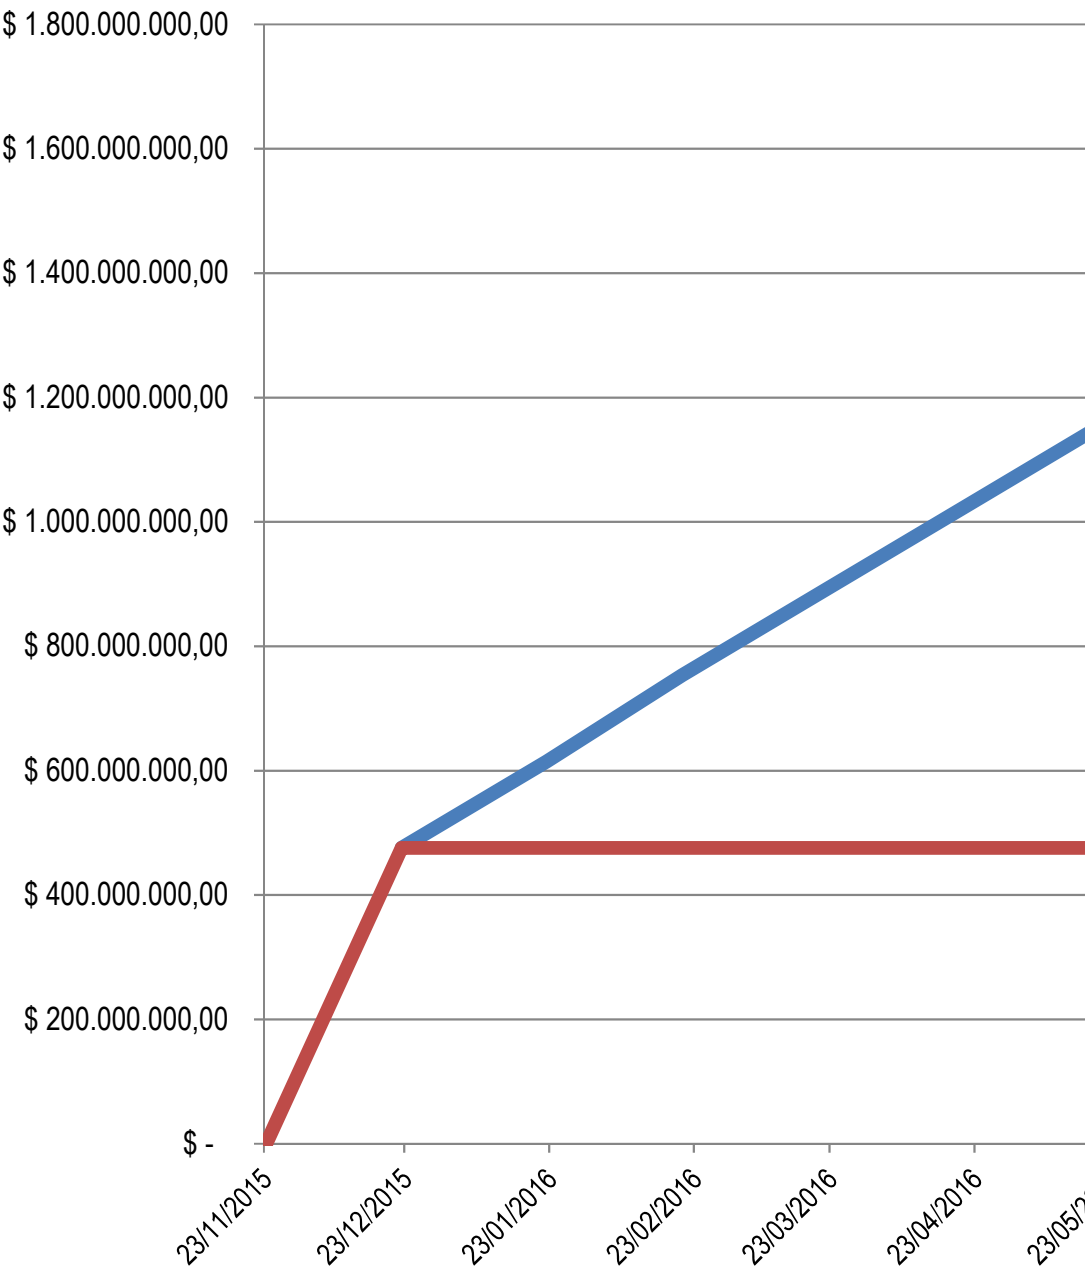

684870200

