

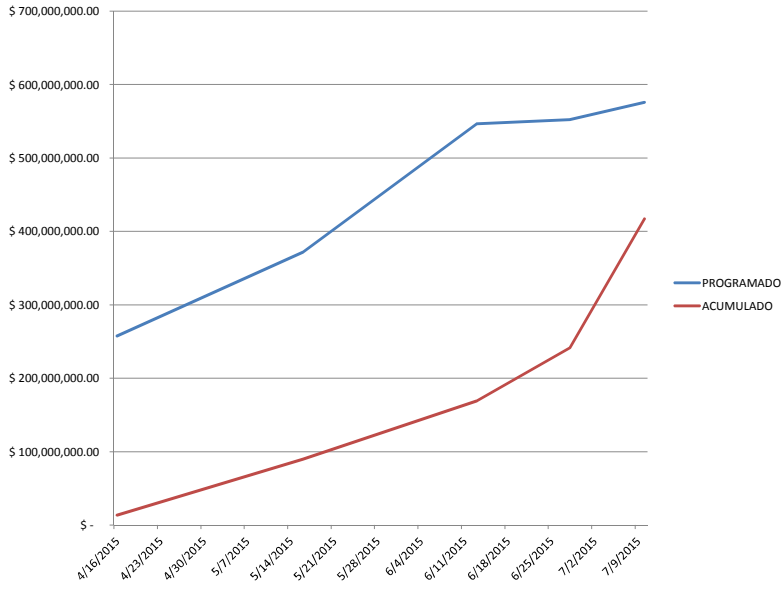

		INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORÍA No		5					
PROYECTO No.		OBJETO DEL PROYECTO		CONSTRUCCION DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ACABADOS PARA LAS ESTACIONES SUPERIOR, INTERMEDIA E INFERIOR DEL TELEFERICO DEL SANTUARIO DE LAS LAJAS, MUNICIPIO DE IPIALES, DEPARTAMENTO DE NARIÑO							
MUNICIPIO	IPIALES	DEPARTAMENTO	NARIÑO	PERIODO DEL INFORME		4/06/2015	AL	10/07/2015	FECHA INFORME	10/07/2015	
OBJETO DEL CONTRATO		CONSTRUCCION DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ACABADOS PARA LAS ESTACIONES SUPERIOR, INTERMEDIA E INFERIOR DEL TELEFERICO DEL SANTUARIO DE LAS LAJAS, MUNICIPIO DE IPIALES, DEPARTAMENTO DE NARIÑO									
CONTRATO DE OBRA						CONTRATO DE INTERVENTORIA					
CONTRATO No.: FNT-301 DE 2014						CONTRATO No.: FNT-312-2014					
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL FONTUR IPIALES						CONTRATISTA: ALVARO VERGARA GONGORA					
FECHA DE INICIACION: 16 de febrero de 2015						FECHA DE INICIACION: 16 de febrero de 2015					
PLAZO INICIAL (MESES): 2.00						PLAZO INICIAL (MESES): 2.50					
FECHA DE TERMINACION INICIAL: 16 de abril de 2015						FECHA DE TERMINACION INICIAL: 30 de abril de 2015					
ESTADO DEL CONTRATO						ESTADO DEL CONTRATO					
EN EJECUCION						EN EJECUCION					
TIEMPO SUSPENDIDO (DIAS): 30						TIEMPO SUSPENDIDO (DIAS): 30					
PLAZO ADICIONAL (MESES): 2.00						PLAZO ADICIONAL (MESES): 2.00					
FECHA DE TERMINACION FINAL: 15 de julio de 2015						FECHA DE TERMINACION INICIAL: 29 de julio de 2015					
PLAZO EJECUTADO %: 95.80%						PLAZO EJECUTADO %: 85.55%					
VALOR INICIAL: \$ 600,175,191						VALOR INICIAL: \$ 45,124,000					
VALOR ADICIONES: \$ -						VALOR ADICIONES: \$ -					
VALOR ACTUALIZADO: \$ 600,175,191						VALOR ACTUALIZADO: \$ 45,124,000					
SALDO POR AMORTIZAR ANTICIPO: \$ 41,522,672						SALDO POR AMORTIZAR ANTICIPO: \$ -					
VALOR PAGADO: \$ 392,561,831						VALOR PAGADO: \$ 24,943,891					
EJECUCION PRESUPUESTAL: 65.41%						EJECUCION PRESUPUESTAL: 55%					
ESTADO DE LAS LICENCIAS O PERMISOS DEL PROYECTO											
LICENCIA O PERMISO	ENTIDAD QUE LO OTORGA	ESTADO	FECHA DE EXPEDICION								
CONEXION ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	EMPOOBANDO	EN TRAMITE	Aug-14								
PERMISO ACOMETIDA ELECT	CEDENAR	OTORGADA	Aug-14								
LICENCIA AMBIENTAL	CORPONARIÑO	OTORGADA	Jun-11								
LICENCIA DE CONSTRUCCION	PLANEACION MUNICIPAL	OTORGADA	Mar-12								
AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA											
	PROGRAMADO \$	EJECUTADO \$	DIFERENCIA \$	CUMPLIMIENTO % (E/P)							
Acumulado anterior	\$ 552,308,574.00	\$ 241,741,846.00	\$ (310,566,728.00)	44%							
Durante el periodo	\$ 23,457,824.00	\$ 175,447,493.00	\$ 151,989,669.00	748%							
Acumulado actual	\$ 575,766,398.00	\$ 417,189,339.00	\$ (158,577,059.00)	72%							
AVANCE FISICO DEL CONTRATO DE OBRA											
GRANDES PARTIDAS DE EJECUCION	PROGRAMADO	EJECUTADO	CUMPLIMIENTO % (E/P)								
FINALIZACION ESTACION SUPERIOR	95%	73.00%	76.84%								
PISOS ESTACION INTERMEDIA	0%	0%	0%								
FINALIZACION ESTACION INFERIOR	93%	15.00%	16.13%								
OBRAS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	98%	83.00%	84.69%								
SUMINISTRO DE MATERIALES	0%	0%	0.00%								
											
OBSERVACIONES											
Porcentaje de avance de obra actual: 69.51% con respecto al valor total del contrato.											
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> ALVARO VERGARA GONGORA NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA </div> <div>  FIRMA REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA </div> </div>											
