

estā aplicando recebo pedrudo en el costado Oriental para recuperar el terreno perimetral;

Entero de  
Oron/aur/ur  
R-INT

Juan Carlos Jara  
Tecn. Supervisor de obra  
Consorcio FAWCETT- ASSIENIA

008 22. DE OCT-2016

Se repasaron los pases de  $\phi 4"$  con braca de  $4\frac{1}{2}"$  en las Vigas-canal para insertar tramos de Tubo A.I.L.  $\phi 4"$  y se emborñ con Sikatop 122. (14 tubos  $\phi 4"$  L = 1 mt c/u). acti para encauzar las aguas lluvias de cubierta a las cajas.

Entero de  
Oron/aur/ur  
R-INT

Juan Carlos Jara  
Tecn. Supervisor de Ob  
Consorcio FAWCETT- ASSIENIA

009 27. OCT-16.

Se acopió material en N.00 costado Oriental (arena gruesa) y se llevó el elevador al N.470 para iniciar trabajos de pendienteado en las Vigas canales de cost. Norte y Sur. así como la construcción de bordillos en el costado Norte.

Entero de  
Oron/aur/ur  
R-INT

010 1º NOV-16

EL personal Subcontratista del area. fontaneria, continua con la Extracción de Núcleos  $\phi 6"$  y  $\phi 4"$ ; además de la instalación de Tubería descolgada y adecuación de puntos de A.I.L.

Entero de  
Oron/aur/ur  
R-INT

011 2º NOV-16

El personal de Administración termino La extensión de Recebo pedrudo en el costado Oriental "Patio de maniobras". No se ha compactado debido a las continuas lluvias. Se está terminando de adecuar toda la nueva zona de Administración.

Entero de  
Oron/aur/ur  
R-INT

012 21 NOV-16

YO ANAMARIA ENCISO RECIBO A PARTIR DE HOY LA FUNCIÓN DE RESIDENTE DE OBRA. SE DEFINIÓ CON EL ING OSCAR QUE EL MURO ESTRUCTURAL COMPRENDIDO ENTRE LOS EJES SA1 Y SA3 SE VA A LEVANTAR CONFORME SE ENCUENTRA LA ESTRUCTURA, CON LA DIFERENCIA DE 3CM ENTRE UN EJE Y EL OTRO.

entendido  
Oscar  
R-Int.

~~Anamaria~~  
RESIDENTE OBRA  
CONSORCIO FAWCETT-ASSIGNIA

013 22-NOV-16

SE INICIÓ EL LEVANTE DEL MURO DE FACHADA ENTRE EJES SA1 Y SA3.

SE ESTAN INSTALANDO LAS BLL EN EL SECTOR NORTE DEL EDIFICIO. SE HIZO PRUEBA DE ESTANQUEIDAD EN EL EJE SA

entendido  
R-Int  
Oscar

~~Anamaria~~  
RESIDENTE OBRA  
CONSORCIO FAWCETT-ASSIGNIA

014 23-NOV-16

EN MURO DE FACHADA EJES SA1 Y SA3 SE LLEGÓ A LA NOVENA HILADA, SE DEJA LISTO PARA LLENAR LAS DOVELAS.

SE DEJARON LAS BLL S5 Y S6 LLENAS PARA HACER PRUEBA DE ESTANQUEIDAD.

entendido  
Oscar  
R-Int.

~~Anamaria~~  
RESIDENTE OBRA  
CONSORCIO FAWCETT-ASSIGNIA

015 24-NOV-16

SE RECIBIERON LAS PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD SA, S5 Y S6. EN LA BALANTE S2 SE CAMBIO EL ACCESORIO QUE TENIA FUGA.

entendido  
Oscar  
R-Int.





PARA LA MAMPOSTERÍA DEL EJE SA1 A SA3 EL REFUERZO DE LA DOVELA DEBE ANCLARSE A LA VIGA. POR TAL RAZÓN, DEBE FIGURARSE COMO SE MUESTRA EN EL DIBUJO SEGÚN RECOMENDACIÓN DE LA INTERVENTORIA.

entrevisto  
Chavez

EN EL MURO DE FACHADA EN BLOQUE ESTRUCTURAL EN EL EJE SG7 A SG10, SE DESPLAZÓ LA MAMPOSTERÍA 10cm HACIA EL INTERIOR, EN COMÚN ACUERDO CON LA INTERVENTORIA, DEBIDO A QUE LA ESTRUCTURA ESTÁ DESPLAZADA HACIA AFUERA CON RESPECTO A LA PLACA DE CONTRAPISO, DE TAL MANERA QUE SI SE DEJABA LA MAMPOSTERÍA ALINEADA A LA ESTRUCTURA, ESTA QUEDARÍA APOYADA SOBRE EL ANDÉN PERIMETRAL. . .

entrevisto  
Chavez  
2-INT.


Agradecido  
RESIDENTE OBRA  
CONSORCIO FAWCETT-ASSIGN

016 25-NOV-16

SE HICIERON ANCLAJES Y SE COMENZÓ LA MAMPOSTERÍA EN EL EJE SG7 A SG10. EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DEL PROYECTO, EN SOTANO 2, LOS TUBOS DE 6" QUE RECIBEN LAS BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS, QUEDARON MUY SEPARADOS DE LAS COLUMNAS Y DES-PLOMADOS. POR TAL MOTIVO SE ACORDÓ CON LA INTERVENTORIA, QUE PARA NO DEMOLER LA PLACA DE CONTRAPISO, SE VA A TRATAR AL MÁXIMO DE AJUSTAR LA BAJANTE A ESE TUBO, SABIENDO QUE NO VAN A QUEDAR A PLOMO NI PEGADAS A LA COLUMNA. Agradecido

017 28-NOV-16

SE MODIFICA EL ANCLAJE DE LAS DOVELAS EN LA MAMPOSTERÍA DEL EJE SA1 A SA3, PROPUESTO EN LA ANOTACIÓN 015.

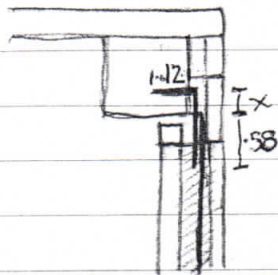

AHORA SE HACE ANCLAJE AL FRENTE DE LA VIGA DE 12CM Y SE TRASLAPAN 58CM MAS LA LONGITUD X QUE ESTÁ POR DEFINIR EN OBRA.

~~A. FANCETTI~~

RESIDENTE OBRA

CONSORCIO FANCETTI-ASSIGNIA

218 29-NOV-16

LAS VENTANAS PV-02 SE MODULAN A 060x060 Y LOS ESPACIOS ENTRE ESTAS TAMBIÉN.

SE AUTORIZA POR LA INTERVENTORIA, DEJAR 5 VENTANAS EN LA FACHADA ENTRE LOS EJES SA1 Y SA3. 3 ENTRE SA1 Y SA2 Y DOS ENTRE SA2 Y SA3. SE DEJAN VENTANAS PV-02.

SE RETOMA LA ACTIVIDAD DE LOS BORDILLOS EN LA TERRAZA NORTE PISO 2.

~~A. FANCETTI~~

RESIDENTE OBRA

CONSORCIO FANCETTI-ASSIGNIA

219 SE ACABA QUE LA AUTORIZACIÓN DADA POR LA INTERVENTORIA EN LA NOTA 018, FUE DADA POR LA SOLICITUD PRESENTADA POR EL CONSORCIO, DE PROPONER A LOS BAÑOS DEL COSTADO SUR, DE ILUMINACIÓN NATURAL

~~A. FANCETTI~~

RESIDENTE OBRA

CONSORCIO FANCETTI-ASSIGNIA



020 30-NOV-16

SE CONTINUA CON LA LABOR DE BORDILLOS EN EL SEGUNDO PISO COSTADO NORTE, DONDE SE FUNDIÓ EL SEGUNDO TRAMO EN BORDE DE PLACA, EN LOS BORDILLOS DE LAS VENTANAS SE HICIERON ANCLAJES.

EN MAMPOSTERÍA DE FACHADA SE LLEGÓ AL NIVEL DE LA VIGUETA ENTRE LOS EJES SA1 A SA3 Y SE SIGUEN LEVANTANDO LAS MUROS ENTRE SG7 A SG10.

YA SE LANÓ LA VIGACANAL DEL COSTADO SUR PARA EL MURO DOBLE EN LOS BAÑOS PARA LA INSTALACIÓN DE LAS TUBERÍAS, SE ACORDÓ JUNTO CON LA INTERVENTORIA, QUE ESTE SE VA A DEJAR A 80CM DEL PISO ACABADO PARA QUE QUEDA AL MISMO NIVEL DEL LAVAMANOS. EN LA ZONA DE LOS ORINALES SI SE VA A LEVANTAR HASTA EL CIELO RASO.

AL SIMBRAR LA MAMPOSTERÍA DE LA FACHADA INTERNA DE LA COCINA, ESTA NO QUEDA ALINEA CON LA ESCALERA NOR-OR. SE TOMA LA DECISIÓN EN COMPAÑÍA DE LA INTERVENTORIA DE MOVER EL MURO DE CERRAMIENTO DE LA ESCALERA HACIA EL SUR, RESPETANDO EL VAÑO DE LA PUERTA Y SE ELIMINA LA LUCARNA EN LA LONGITUD DE ESE MURO ESPECIFICO, EL RESTO DE LA LUCARNA QUEDA ABIERTA.

Aromatresos

RESIDENTE OBRA

CONSORCIO FAXICET77-ASSIGNIA

071 01-DIC-16
