

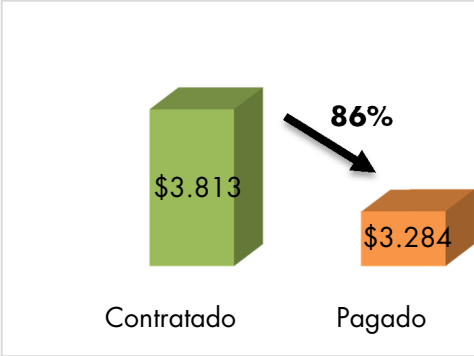


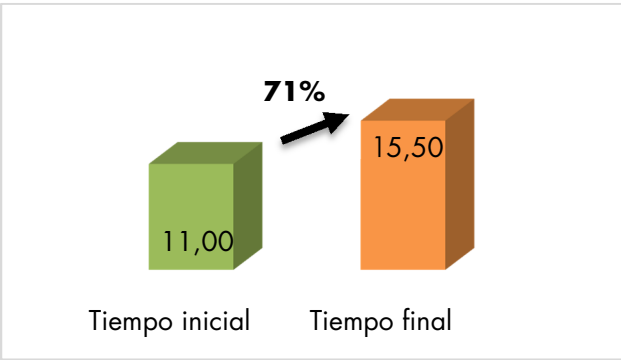
INFORME DE RESULTADO DE LA MEDICIÓN DE INDICADORES DE LOS PROYECTOS

AÑO 2018

A. MEDICIÓN DE GESTIÓN

En este literal se incluyen los proyectos que durante el periodo arriba indicado, fueron medidos en su gestión en los indicadores: eficiencia, control y avance.


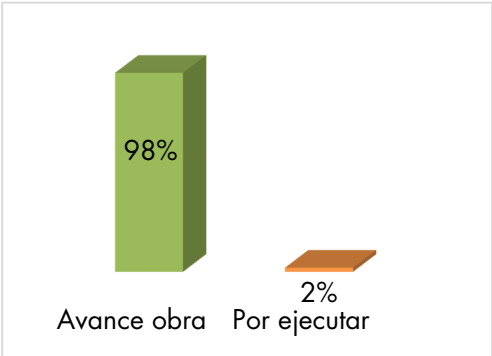
Línea	Nombre Indicador	Resultado	Análisis y Gráfica
Infraestructura Turística: Adición al proyecto: Construcción Sendero Caño Cristales (Meta) de MinCIT,	Eficiencia en la planeación del presupuesto del proyecto	86%	<p>Obra actualmente en ejecución, éste proyecto se vio afectado por acto terrorista, por lo que requirió la reconstrucción del centro de apoyo al turista, denominado Centro Multipropósito de Visitantes en el sector "El Cajuche", por acto terrorista que afectó las instalaciones recién terminadas.</p>  <p>Cifras millones COP</p> <p>El costo total presupuestado es \$3.812.778.249, lo pagado con corte a 15 de noviembre de 2018 corresponde a \$3.284.203.400.</p>
	Precisión en el tiempo de ejecución de las actividades	71%	<p>Para reconstruir las zonas afectadas se prorrogó 4,5 meses al plazo inicialmente pactado.</p>

Línea	Nombre Indicador	Resultado	Análisis y Gráfica
aprobado por Comité Directivo el 02 de agosto de 2018 por valor de \$250 mlls, total proyecto \$3.534 mlls.			 <p>Meses</p> <p>El pazo inicial era de 11 meses y se prorrogó 4,5 meses quedando en 15,5 meses.</p>

B. MEDICIÓN DE IMPACTO

En este literal se incluyen los proyectos que durante el periodo arriba indicado, fueron medidos en su impacto en los indicadores: resultado, producto, impacto y productividad.

Línea	Programa	Nombre Indicador	Resultado	Análisis y Gráfica
		Resultado : Generación de	30 empleos directos en la fase de ejecución 8 empleos	<p>Durante la ejecución del proyecto se crean 30 empleos directos.</p> <p>En la fase de operación se crean 8 empleos directos, 6 en la operación de los locales comerciales y 2 por los operadores de Cormacarena y Parques Nacionales Naturales.</p>

Línea	Programa	Nombre Indicador	Resultado	Análisis y Gráfica
Infraestructura Turística: Adición al proyecto: Construcción Sendero Caño Cristales (Meta) de MinCIT, aprobado por Comité Directivo el 02 de agosto de 2018 por valor de \$250 mlls, total proyecto \$3.534 mlls.	Obras de Infraestructura Turística	empleo	directos en la fase de operación	 <p>Ejecución obra: 30 Operación: 8</p> <p>Empleos</p>
		Producto: Obra Construida	98%	<p>El avance general de la obra es del 98%, está en ejecución actualmente la instalación de las flechas y señales informativas e interpretativas en los senderos de Caño Cristales.</p>  <p>Avance obra: 98% Por ejecutar: 2%</p>



C. RECOMENDACIONES GENERALES

El siguiente cuadro presenta las recomendaciones que realiza la Gerencia de Infraestructura con respecto al resultado de la medición de los indicadores por tipología de proyectos (línea y/o programa):

Línea	Programa	Resultado	Recomendaciones
Infraestructura Turística	Obras de infraestructura turística		Ajustar la batería de indicadores del Manual de destinación de recursos y presentación de proyectos, vigencia: 29 de junio de 2018.

Fecha: 10 de diciembre de 2018

MARIA VICTORIA FLOREZ DOMÍNGUEZ

Gerente (E) de infraestructura
