


OBSERVACIONES

Aunque la grafica de ejecucion muestra un cero (0) de avance de obra esto obedece a como esta establecida la forma de pago, sin embargo se han realizado trámites, reuniones de avance y seguimiento, compra de materiales, preliminares de actualización de diseños; se ha comenzado la fabricación entre otras, sin embargo

Se avanza en la fabricación de señalización vehicular, diseños de señalización vehicular y diseños de señalización peatonal.

REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIZACION DE SITIOS DE UBICACIÓN DE LAS SEÑALES

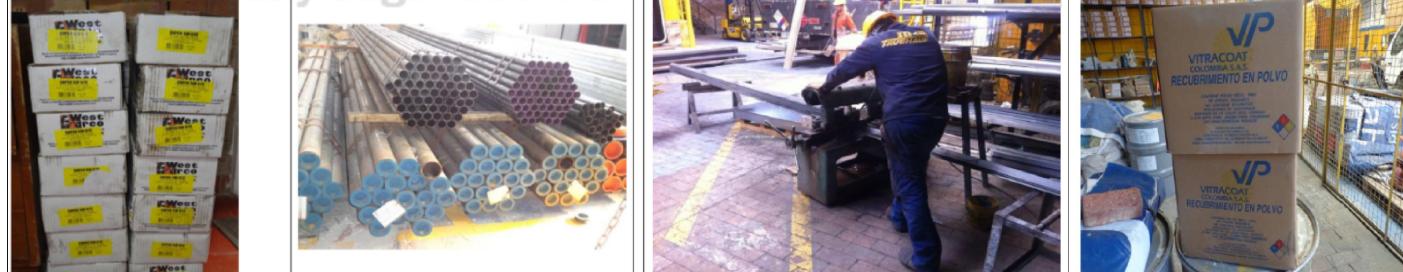

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
JOSE JOAQUIN ORTIZ GARCIA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

Primer pago: \$83'043.240 (15% del valor del contrato)
Actas parciales: \$30'642.956 (7,38% del 75% del valor del contrato de intervención)
Total: \$113'686.196=20,54% del valor total del contrato

4 CONVENCIONES

CONVENCIONES

CAPÍTULOS

SUBCAPÍTULO

TAREA

ACTIVIDADES

[REDACTED]

i

[REDACTED]



		PROGRAMADO		
MES	FECHA	MES	SEMANAL	ACUMULADO
INICIO	23/11/2015	\$ -		
1	22/12/2015	\$ -		
2	22/01/2016	\$ -		
3	20/02/2016	\$ -		
4	22/03/2016	\$ -		
5	21/04/2016	\$ 608.000.800,00		\$ 608.000.800,00
6	22/05/2016	\$ 336.476.800,00		\$ 944.477.600,00

PROGRAMADO				
MES	FECHA	MES	ACUMULADO	
INICIO	23/11/2015	\$ -	\$ -	-
1	22/12/2015	\$ -	\$ -	-
2	22/01/2016	\$ -	\$ -	-
3	20/02/2016	\$ -	\$ -	-
4	22/03/2016	\$ -	\$ -	-
5	21/04/2016	\$ 608.000.800,00	\$ 608.000.800,00	608.000.800,00
6	22/05/2016	\$ 336.476.800,00	\$ 944.477.600,00	944.477.600,00

EJECUTADO			
MES	SEMANAL	ACUMULADO	
\$ -		\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -		\$ -	
\$ -		\$ -	
\$ -		\$ -	
\$ -		\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	

EJECUTADO
ACUMULADO
